


4 - 1 . 顧客ランクに応じた営業活動 (案)

※今後ブラッシュアップ



- 発電所ライフサイクルと累計営利率の2軸でセグメントを分類してはどうか。
(構築中の受売利可視化ダッシュボードと紐づける)
- 短期的に営利率の悪化を許容出来る期間 (売上高に対して引合費の掛かる期間) は、① AS 立上がり期、③大型改造検討期に限られる。(大型改造の基準金額、有無の見極めは重要)
- よって②定検中心の期間における累計営利率の良否にてランク A ~ C を判断する。
- 併せてランク (A-1~A3,B-1~B2,C) に応じた引合管理値を設定していく。


発電所別累計営利率

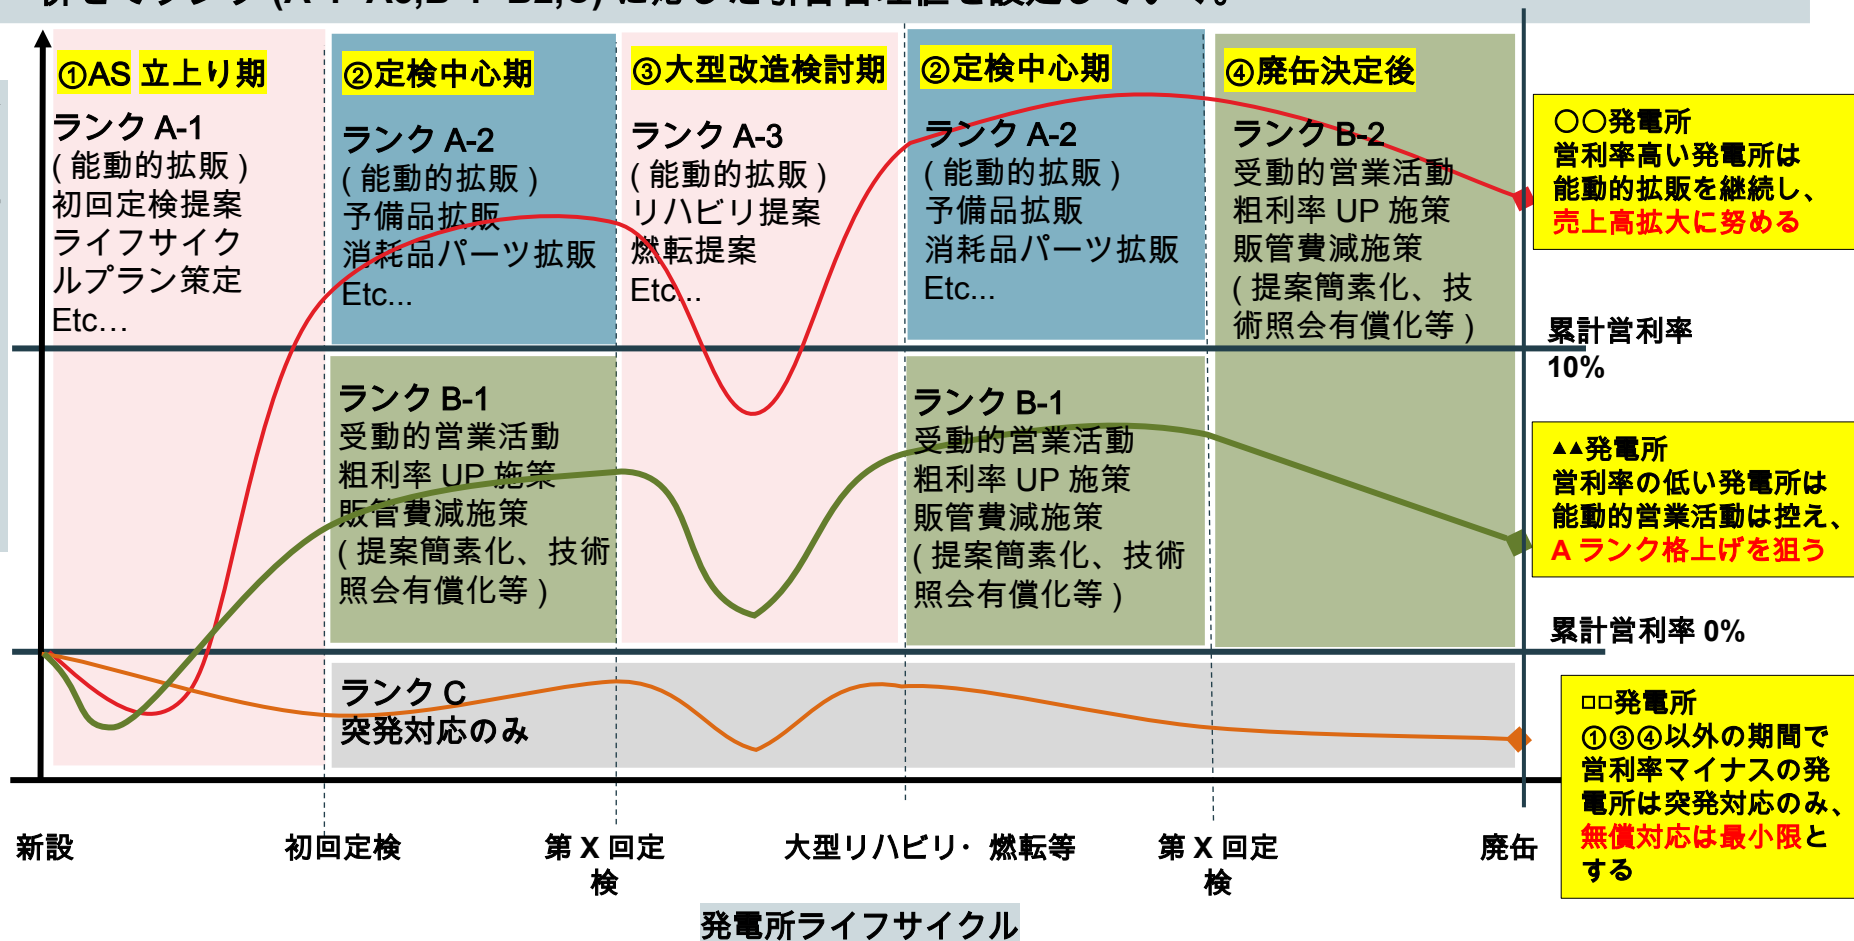

4-2. 経営数値のダッシュボード構築について

- PM中心のマネジメントサイクルを構築するうえで、発電所単位で採算状況把握する為の仕組み。
- 下表①受売利はまだ構築途中。各PMにおかれては発電所別採算把握が開始出来ていない。
- 下表②③④は本日以降、公開開始する。

【可視化モデル運用の位置づけ】

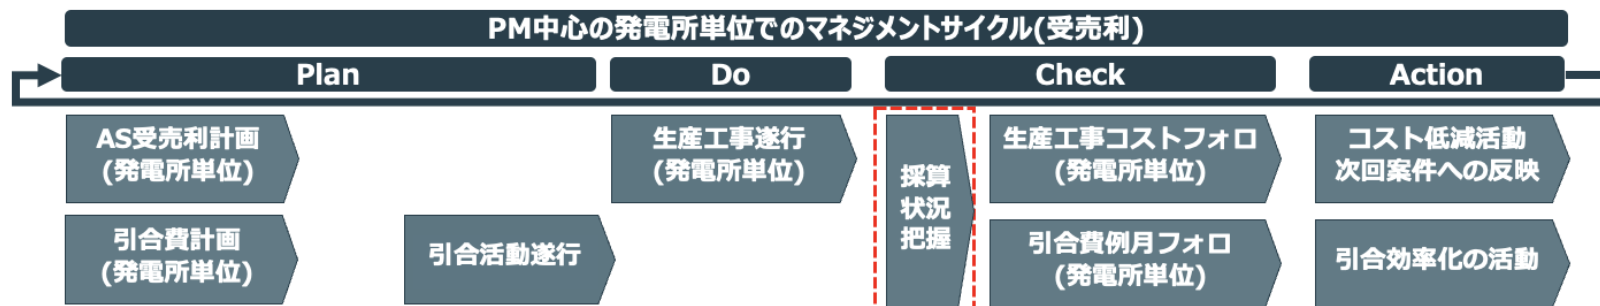

■発電所単位で営利状況が把握出来る様にする取り組み

【適用スケジュール】


	FY23				FY24					進捗状況	
	1Q	2Q	3Q	4Q	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
1. 改革テーマ選定	■	■									■PM中心に採算管理していく方針策定_済 (受売利、引合費の可視化) ■ASシフト、多能工化促進の為のKPI策定_済 (AS従事比率、直接作業比率)
2. 可視化項目選定		■	■								
3. 可視化モデル作成/調整			■	■							
4. <u>PowerBI</u> 化(ソフ4)				■	■						①受売利実績の構築に遅れあるが ②～④は計画通りリリース
5. 実運用への調整(事業戦)				■	■	■					
6. 運用開始							■	■	■	■	①受売利実績：システム構築中 ②引合費実績： ・PM/AM及び各部課長以上向けに公開開始 ※引合管理値は未だ表示できず。 ③④各部課長以上向けに公開開始する
①受売利実績							■	■	■	■	
②引合費実績					■	■	■	■	■	■	
③AS従事実績比率							■	■	■	■	
④直接作業実績比率							■	■	■	■	

引合費例月Fにて
エクセルベースで仮運用中

4 - 3 . 見積作業の効率化について (見積簡略化 TT、CATS+)

■PM 中心のマネジメントサイクルを構築するうえで、引合効率化の活動として実施中。

【見積作業効率化の位置づけ】

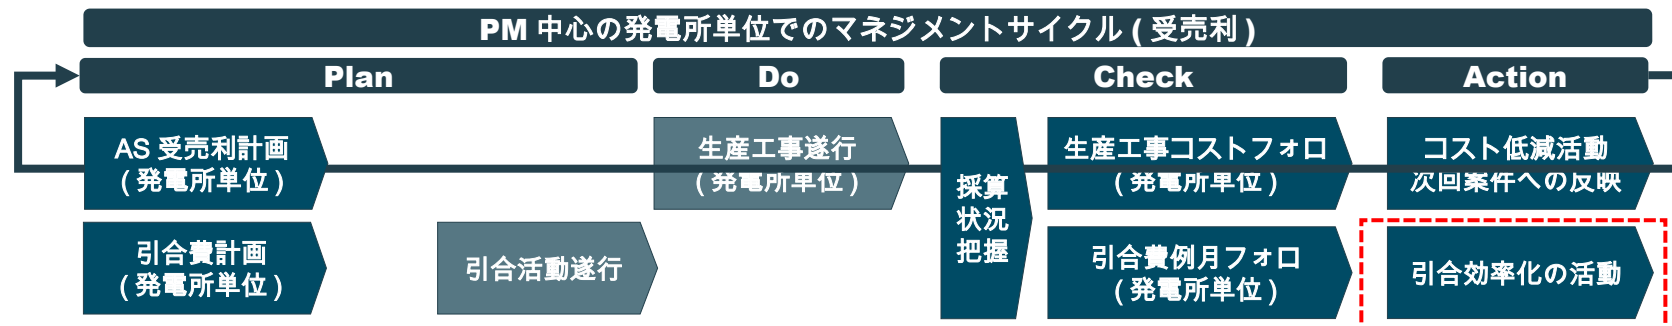

【適用スケジュール】

■見積作業、技術照会、顧客提案それぞれで活動

	FY23				FY24						進捗状況	
	1Q	2Q	3Q	4Q	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
1. 簡略化 TT (簡易見積可否を情報共有する仕組み)											計画通り進捗中	
①活動内容の検討												
②国内ボイラでの活動												■活動浸透し件数増加中。 ■空設は 3 件、燃技は 4 件実施し徐々に拡大。 ■③の状況を鑑み、展開検討していく。 ■1 件実施済。
③国内空設・燃技へ水平展開												
④海外案件への展開検討												
⑤旧呉案件 (国内ボイラ)												
2. CATS+ (過去実績を流用する仕組み)												
①システム構築											■運用性向上等、適用率向上施策実施中。 ■7 月稼働開始予定。 ■展開へ向け、システム構築中	
②海外 ST 運用												
③海外ミル・制御装置展開												
④国内・海外ファン展開												

計画通り進捗中

⇒適用顧客拡大 ⇒活動の浸透

⇒活動開始 ⇒活動の浸透

⇒活動開始

⇒活動開始 ⇒活動の浸透

⇒活動開始

■活動浸透し件数増加中。
■空設は 3 件、燃技は 4 件実施し徐々に拡大。
■③の状況を鑑み、展開検討していく。
■1 件実施済。

■運用性向上等、適用率向上施策実施中。
■7 月稼働開始予定。
■展開へ向け、システム構築中

4 - 3 . 見積簡略化 TT、CATS+ の適用件数

■FY24/5 月末までの見積件数は総計約 850 件 (呉案件除く)。

■昨年度上期開始した国内ボイラ本体・海外 ST は適用率約 25% と高い (赤枠) が、バーナ・ミル・空設案件は定着化・拡大が必要な状況 (青枠)。

SPMI 見積件数(呉案件除く) ※各見積に製品重複あり		年度計 FY24												見積業務改善	備考
		見 積 件 数	4月 見 積 件 数	5月 見 積 件 数	6月 見 積 件 数	7月 見 積 件 数	8月 見 積 件 数	9月 見 積 件 数	10月 見 積 件 数	11月 見 積 件 数	12月 見 積 件 数	1月 見 積 件 数	2月 見 積 件 数		
ボイラ本体 (内数)	国内	127	57	70										簡略化TT	■ 適用件数増加(FY23は月平均6件) ■ 人員拡充しながら組織的に対応中 ■ 素早い対応が必要な定検追加工事を対応開始
	簡略化TT 率	32 25%	14 25%	18 26%											
	海外	37	15	22											
バーナ (内数)	国内	41	13	28										簡略化TT	■ 適用出来た案件は限定的 (過去と同一見積、カタログ品に近い案件のみ) ■ 設計担当の工数メリット低く定着・拡大していない。 見積スピード、製造・建設との情報共有メリットがあり、全体最適の観点を持っていただく事が必要。
	簡略化TT 率	3 7%	3 11%												
	海外	18	4	14											
ミル (内数)	国内	41	21	20										簡略化TT	■ 7月稼働開始予定
	簡略化TT 率	1 2%	1 5%												
	海外 CATS+ 率	11	7	4											
空設案件 (内数)	国内	49	26	23										簡略化TT	■ 5月はタスクチームに回ってきた案件無し。 営業側で回せる案件無かったか再確認する。
	簡略化TT 率	3 6%	3 12%												
	海外	5		5											
ファン (内数)	国内	45	15	30										CATS+	■ 下期稼働開始予定
	海外 CATS+ 率	23	9	14											
制御装置 (内数)	国内	67	31	36										CATS+	■ 7月稼働開始予定
	海外 CATS+ 率	52	17	35											
ST (内数)	国内	86	44	42										CATS+	■ 適用率向上の為、精度・早さ・使いやすさに着目し改善取組中。(目標70%)
	海外 CATS+ 率	100 26 26%	39 10 26%	61 16 26%											
プラント機器	国内	42	28	14											
	海外	18	7	11											
その他 (検査・TA派遣・定検追加工事等)	国内	37	14	23											
	海外	54	16	38											
見積件数合計		535 318	249 114	286 204											

3 . 活動進捗サマリと本日の報告対象 (再掲)

- 各活動の進捗状況は下表の通り、11項目のうち5項目の遅れ、それぞれ挽回策を打つ。
- 本日はフェーズ2からの継続活動の進捗及びフェーズ3進捗状況を主に報告する。

分類	取組み項目	進捗状況	ゴール	完了日
全般	継続活動 顧客セグメンテーション見直し	ライフサイクルに沿った受注活動が出来るよう、顧客ランク・セグメントの再定義中	見直した顧客ランクに応じた営業活動が出来る	8/9
	継続活動 経営数値のダッシュボード構築 ①受売利(営利)、②引合費 ③AS 従事比率、④直接作業比率	①構築に遅れ：ソフ4へ依頼し挽回図る ②~④ ほぼ※構築完了。本日リリース ※引合管理値は未だ表現出来ず継続構築中	職制・担当がいつでも最新情報を閲覧出来る	①8/9 ②~④ 6/25
	引合費予算策定フォーム構築	対象発電所選定、説明会準備中。 検討の遅れ：ドラフト作成後営業部へ相談予定	予算設定完了し、例月フォロの管理値へ反映	8/9
引合業務	継続活動 引合費例月フォロ	細かな改修続けながら例月フォロ実施中	運用中	-
	見積作業の効率化 ①見積簡略化 TT、② CATS+	①ボイラ本体適用率向上、水平展開開始。 ②海外 ST 継続適用中。水平展開準備中	水平展開製品を見極め、運用定着化	FY24 末(見極)
	技術照会の効率化	・ 問合せ受領時の仕訳フローを 例月 F 補助資料として活用中	運用中	-
フェーズ3	顧客提案の効率化	・ 提案書作成ガイドラインを 次回定検後適用予定(ボ本設)	技術部他製品への展開	9/E
引合/遂行	見積・実行フォロ業務 フェーズ3 (工程)の整流化・効率化	見積 G、コスト G、PJG の業務フローから課題抽出中。検討の遅れ：引続き各部協力依頼予定	ToBe 業務フロー確定 各課実行の為の準備完了	8/9
遂行業務	間接業務の効率化	・ 直接作業比率目標 72% を各部部門費期首 フォロにて周知。	運用中	-
	設計業務の整流化・効率化	・ 技術部全体の工数計上実績からターゲット 絞込み中。検討の遅れ：引続き各部協力依頼予定	ToBe 業務フロー確定 各課実行の為の準備完了	8/9

- 見積 G と PJG の業務の一部については、前フェーズで機能重複（業務範囲は独立）を確認。対象業務の他、課題の有無を工数などのコスト踏まえ調査。
- コスト G の業務については、前フェーズでの効率化の候補業務が明確になっていない為、プロジェクト管理業務のコスト状況を鑑み、効率化出来る箇所を調査。

課題仮説

困りごと

見積 工程管理 採算管理

営業部



プロジェクト推進部



取り
纏め

計画部



技術部



長崎調達部



製造部




建設部



長崎品質保証部



機能重複・業務範囲独立
(見積 G・PJG 業務)
業務量分析で課題調査



- ・ 業務量分析の他、課題の明確化には部門を横断した多角的な視野での確認が必要
- ・ 7 月以降も各部にご協力頂き、業務に関するヒアリングを綿密に回すことで、検討・検証サイクルを高速化

5-1 . 見積・ 実行フォロ (金額・ 工程) 業務の分析サマリ

- 業務内容との乖離があるはずなので詳細把握が必要ではあるが、試算上は小口の 10 百万円以下において、相対的に 1 件当たりのプロジェクト管理のコストの割合が高い。
- 費用対効果を鑑みつつ、案件規模に応じ、どの程度までのリスクを許容するか検討することで、効率化できる可能性あり。

【案件規模ごとの AS 売上額、担当者数、コスト (FY23_7 月 ~3

基準受注額①		売上額② 【百万円】	件数③	件数 割合④	担当者数※ 【人】⑤	コスト【百万円 / 件】 ※				基準受注額あたり コスト比率⑩
						合計⑥	見積⑦	実行フォロ (金額) ⑧	実行フォロ (工程) ⑨	
大型改造 2,000 百万円以上		23,683	13	0.4%	19	17	4.6	9.7	2.8	0.85%
大口 100 百万円以上		42,169	259	7.2%	4	0.19	0.093	0.044	0.058	0.19%
小口 100 百万 円未満	全体	19,715	3,308	92.4%	24	0.088	0.033	0.031	0.024	0.09%
	~100 百万	5,609	178	5.0%						0.09%
	~50 百万	9,471	779	21.8%						0.18%
	~10 百万	2,321	536	15.0%						0.88%
	~5 百万	2,048	1,111	31.0%						1.76%
	~1 百万	266	704	19.7%						8.81%

理論値の為、
実態との乖離
の把握・
検証が必要

ヒアリング・分析を通じた各 G の業務を更に効率化されるための事務局の見解は以下のとおり。

- 見積：見積業務を各部または見積 G へ寄せる、または業務自体の削減
- 実行フォロ (金額)：案件規模に応じ、リスクヘッジを鑑み、
1 件当たりのフォロに係るコストの低減で
効率化できるか検証
- 実行フォロ (工程)：小口案件のフォロにて他部との業務重複を把握

⑩ = ⑥ / ① として、計
算

※ 担当者数は業務範囲ごとに按分
(例：大口 / 小口両方の担当は両案件の件数比率に応じて 0.1 人 / 0.9 人
として算出、国内 / 海外両方の担当は 0.5 人ずつとして算出)
※ 担当者当たりのコストを固定値 1,200 万円 / 年として計算
※ 各グループ・金額帯でも、かかるコスト (固定値) に変動
はないものとして計算 (1 名：固定値 1200 万円 / 年が変化しない)
